محضر الاستلام – محطة التحويل الشمالية

التاريخ: 14/03/2026 | رقم المشروع: UW-2291


1. نطاق الاستلام

يشمل الاستلام تجديد معدات المفاتيح الكهربائية جهد 110 كيلوفولت، بما في ذلك الأنظمة الثانوية. نُفذت الأعمال وفقًا للبند 4.2.7 من جدول الكميات. سلّم المقاول جميع تقارير الاختبار.

2. العيوب المكتشفة

رقم	الوصف	المهلة
1	حامل الكابلات في الطابق السفلي غير مؤرض	30/04/2026
2	ترقيم المغذيات الخارجة غير مكتمل	15/04/2026
3	أعمال متبقية في الدائرة الوسيطة لجهاز UPS	30/04/2026

التأريض مفقود

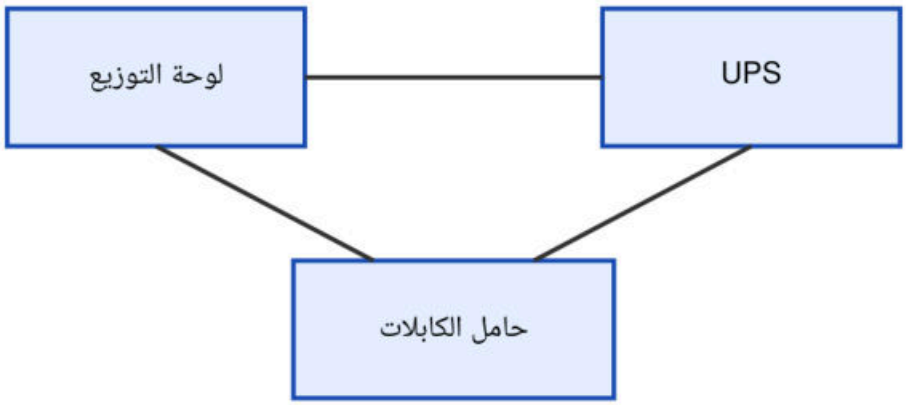

الشكل 1: نظرة عامة على الطابق السفلي

3. الخلاصة

تُستلم المنشأة استلامًا مشروطًا لحين إصلاح العيوب المذكورة أعلاه. من المقرر إجراء إعادة الفحص في الأسبوع 18. وحتى ذلك الحين، يُحتجز 5% من قيمة العقد كضمان.
