গ্রহণ প্রতিবেদন — উত্তর উপকেন্দ্র


তারিখ: 14.03.2026 | প্রকল্প নং: UW-2291

1. গ্রহণের পরিধি

গ্রহণের আওতায় রয়েছে মাধ্যমিক ব্যবস্থাসহ 110 kV সুইচগিয়ারের নবায়ন। কাজটি পরিমাণ তালিকার 4.2.7 নং আইটেম অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। ঠিকাদার সব পরীক্ষার প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছেন।

2. চিহ্নিত ত্রুটি

ক্রম	বিবরণ	সময়সীমা
1	বেসমেন্টের কেবল ট্রে আর্থিং করা হয়নি	30.04.2026
2	বহির্গামী ফিডারের লেবেলিং অসম্পূর্ণ	15.04.2026
3	ইউপিএসের ডিসি লিঙ্কে অবশিষ্ট কাজ	30.04.2026

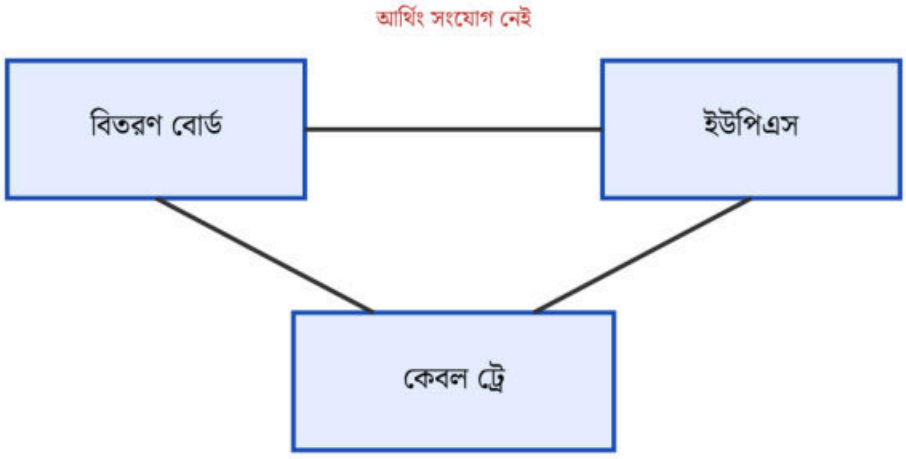

চিত্র 1: বেসমেন্টের সাধারণ দৃশ্য

3. উপসংহার

উপরের ত্রুটিগুলো সংশোধনের শর্তে স্থাপনাটি শর্তসাপেক্ষে গৃহীত হলো। পুনঃপরিদর্শন 18তম সপ্তাহে নির্ধারিত। ততদিন চুক্তিমূল্যের 5% জামানত হিসেবে আটকে রাখা হবে।
