Acta de recepción – Subestación Norte

Fecha: 14/03/2026 | N.º de proyecto: UW-2291

1. Alcance de la recepción

La recepción abarca la renovación de la aparamenta de 110 kV, incluidos los sistemas secundarios. Los trabajos se ejecutaron conforme a la partida 4.2.7 del presupuesto. El contratista ha entregado todos los informes de ensayo.

2. Defectos detectados

N.º	Descripción	Plazo
1	Bandeja de cables del sótano sin puesta a tierra	30/04/2026
2	Rotulación de las salidas incompleta	15/04/2026
3	Trabajos pendientes en el circuito intermedio del SAI	30/04/2026

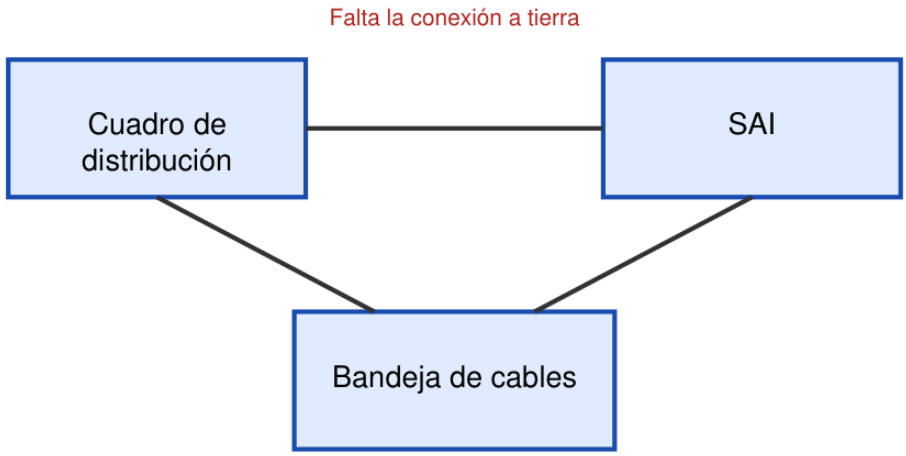

Fig. 1: Vista general del sótano

3. Conclusión

La instalación se recibe con reservas hasta la subsanación de los defectos indicados. La reinspección está prevista para la semana 18. Hasta entonces se retiene el 5 % del importe del contrato como garantía.
