Procès-verbal de réception – Poste Nord

Date : 14/03/2026 | N° de projet : UW-2291

1. Objet de la réception

La réception porte sur le renouvellement de l'appareillage 110 kV, y compris le contrôle-commande. Les travaux ont été exécutés conformément au poste 4.2.7 du bordereau des prix. L'entreprise a remis l'ensemble des procès-verbaux d'essais.

2. Défauts constatés

N°	Description	Délai
1	Chemin de câbles du sous-sol non relié à la terre	30/04/2026
2	Repérage des départs incomplet	15/04/2026
3	Travaux restants sur le circuit intermédiaire de l'ASI	30/04/2026

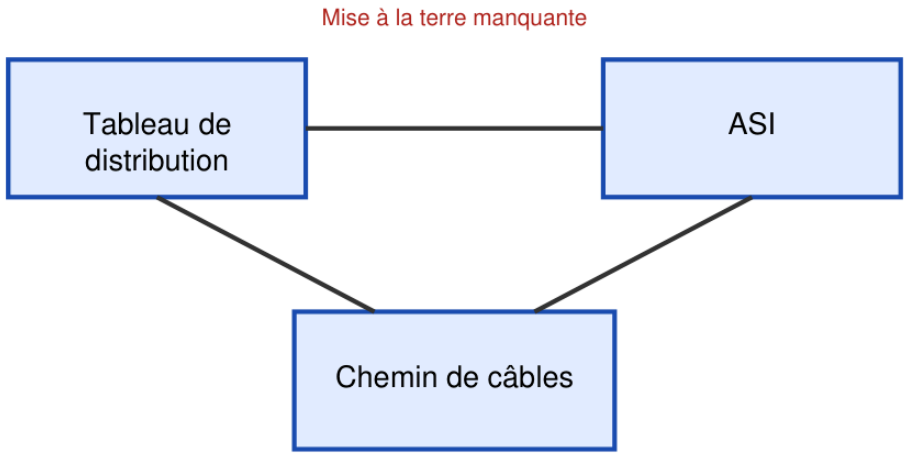

Fig. 1 : Vue d'ensemble du sous-sol

3. Conclusion

L'installation est réceptionnée avec réserves jusqu'à la levée des défauts ci-dessus. La visite de levée des réserves est prévue en semaine 18. D'ici là, une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est appliquée.
