פרוטוקול מסירה – תחנת המשנה צפון


תאריך: 14.03.2026 | מס' פרויקט: UW-2291

1. היקף המסירה

המסירה כוללת את חידוש מערך המיתוג 110 קילו-וולט, כולל המערכות המשניות. העבודות בוצעו בהתאם לסעיף 4.2.7 בכתב הכמויות. הקבלן מסר את כל דוחות הבדיקה.

2. ליקויים שנמצאו

מס'	תיאור	מועד
1	תעלת הכבלים במרתף אינה מוארקת	30.04.2026
2	סימון המזינים היוצאים אינו שלם	15.04.2026
3	עבודות שנותרו במעגל הביניים של האל-פסק	30.04.2026

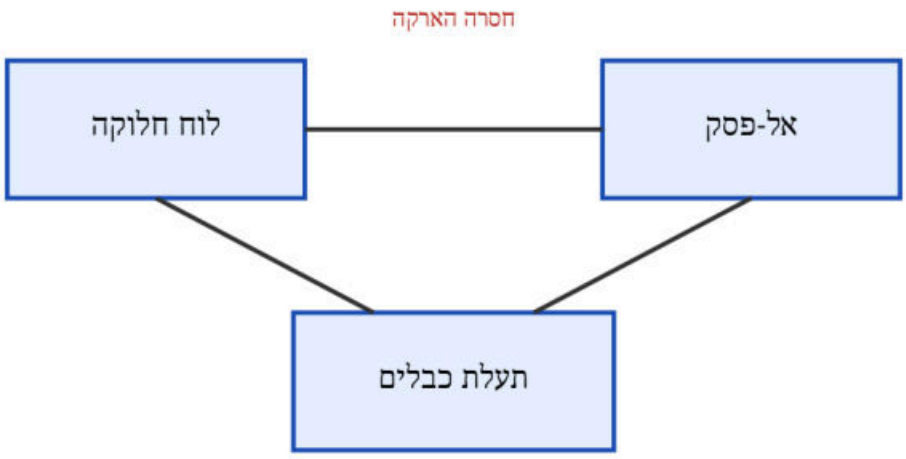

איור 1: מבט כללי על המרתף

3. סיכום

המתקן מתקבל בתנאי עד לתיקון הליקויים המפורטים לעיל. בדיקה חוזרת מתוכננת לשבוע 18. עד אז יעוכבו 5% מסכום החוזה כערבות.
