Berita Acara Serah Terima – Gardu Induk Utara


Tanggal: 14/03/2026 | No. proyek: UW-2291

1. Lingkup serah terima

Serah terima mencakup pembaruan switchgear 110 kV termasuk sistem sekunder. Pekerjaan dilaksanakan sesuai butir 4.2.7 daftar kuantitas. Kontraktor telah menyerahkan seluruh laporan pengujian.

2. Cacat yang ditemukan

No.	Uraian	Batas waktu
1	Rak kabel di ruang bawah tanah belum dibumikan	30/04/2026
2	Pelabelan penyulang keluar belum lengkap	15/04/2026
3	Sisa pekerjaan pada rangkaian antara UPS	30/04/2026

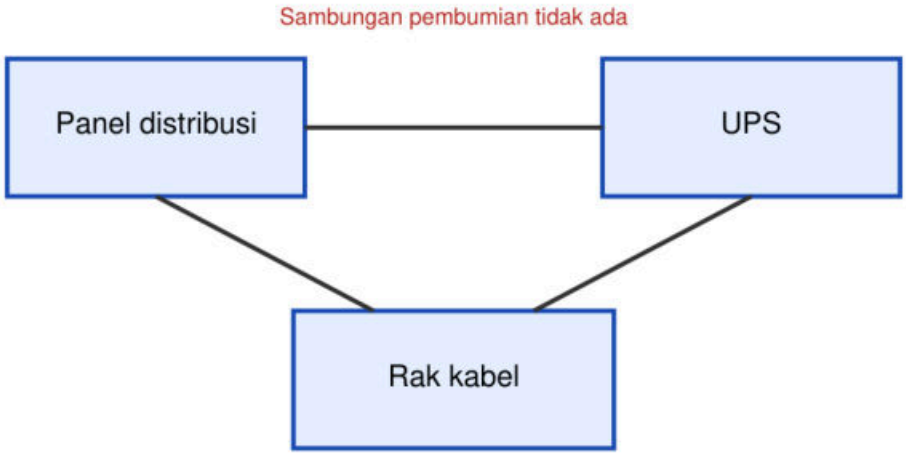

Gambar 1: Gambaran umum ruang bawah tanah

3. Kesimpulan

Instalasi diterima secara bersyarat sampai cacat di atas diperbaiki. Pemeriksaan ulang dijadwalkan pada minggu ke-18. Hingga saat itu, 5% dari nilai kontrak ditahan sebagai jaminan.
