Verbale di collaudo – Sottostazione Nord

Data: 14/03/2026 | N. progetto: UW-2291

1. Oggetto del collaudo

Il collaudo riguarda il rinnovo delle apparecchiature di manovra a 110 kV, compresi i sistemi secondari. I lavori sono stati eseguiti secondo la voce 4.2.7 del computo metrico. L'appaltatore ha consegnato tutti i rapporti di prova.

2. Difetti riscontrati

N.	Descrizione	Scadenza
1	Passerella portacavi nel seminterrato non collegata a terra	30/04/2026
2	Siglatura delle partenze incompleta	15/04/2026
3	Lavori residui sul circuito intermedio dell'UPS	30/04/2026

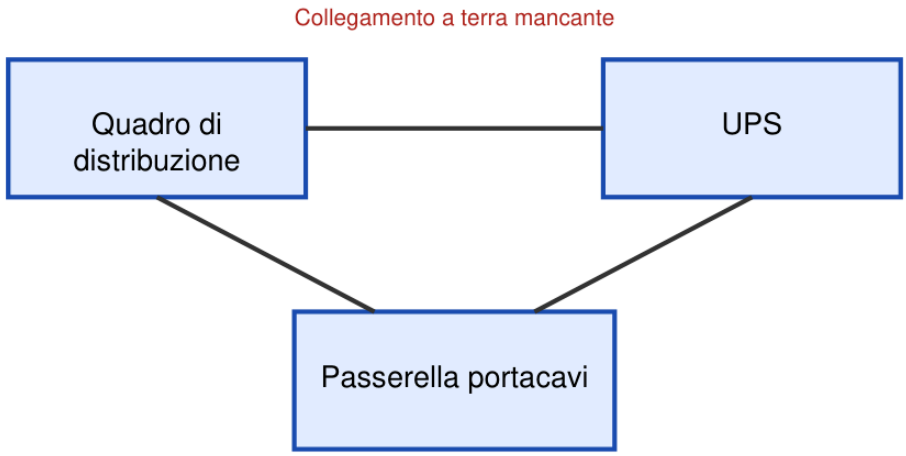

Fig. 1: Panoramica del seminterrato

3. Conclusione

L'impianto è collaudato con riserva fino all'eliminazione dei difetti sopra elencati. Il nuovo sopralluogo è previsto nella settimana 18. Fino ad allora viene trattenuto il 5% dell'importo contrattuale a titolo di garanzia.
