受入検査報告書―北変電所

日付：2026年3月14日｜プロジェクト番号：UW-2291

1. 検査の範囲

本検査は、二次系統を含む110 kV開閉装置の更新工事を対象とする。工事は数量明細書の項目4.2.7に従って実施された。請負者は全ての試験報告書を引き渡した。

2. 指摘事項

No.	内容	期限
1	地下のケーブルラックが未接地	2026年4月30日
2	引出し回線の表示が不完全	2026年4月15日
3	UPS直流中間回路の残工事	2026年4月30日

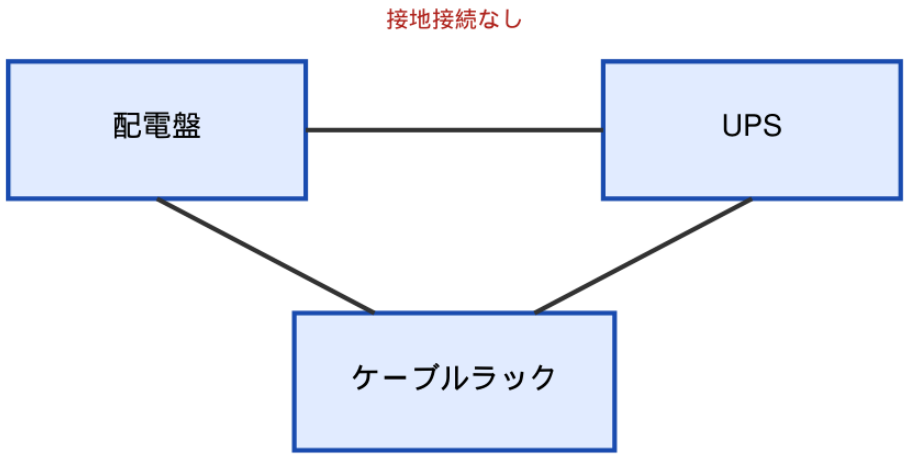


図1：地下の全体図

3. 結論

上記指摘事項の是正を条件として、設備を条件付きで受け入れる。再検査は第18週に予定している。それまでの間、契約金額の5%を保証金として留保する。
