Proces-verbaal van oplevering – Onderstation Noord


Datum: 14-03-2026 | Projectnr.: UW-2291

1. Omvang van de oplevering

De oplevering betreft de vernieuwing van de 110 kV-schakelinstallatie, inclusief de secundaire systemen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens post 4.2.7 van het bestek. De opdrachtnemer heeft alle testrapporten overgedragen.

2. Geconstateerde gebreken

Nr.	Omschrijving	Termijn
1	Kabelgoot in de kelder niet geaard	30-04-2026
2	Codering van de uitgaande velden onvolledig	15-04-2026
3	Restwerkzaamheden aan de tussenkring van de UPS	30-04-2026

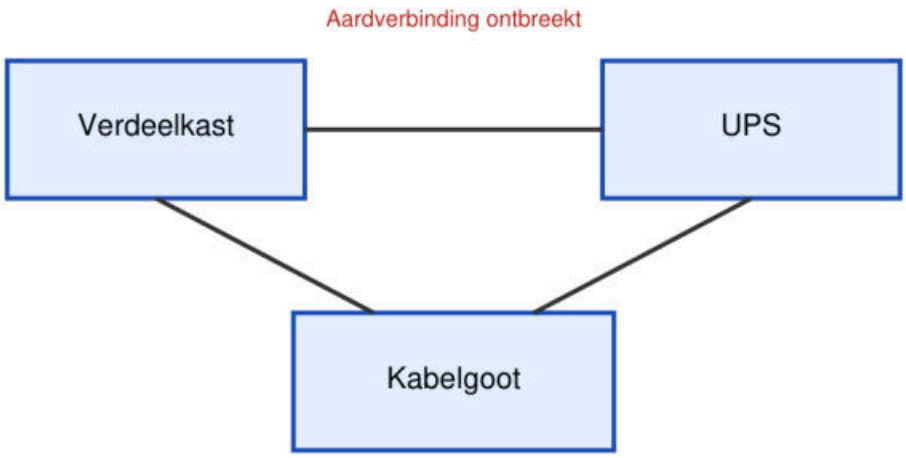

Afb. 1: Overzicht kelder

3. Conclusie

De installatie wordt onder voorbehoud opgeleverd tot de bovengenoemde gebreken zijn hersteld. De herkeuring is gepland in week 18. Tot die tijd wordt 5% van de aanneemsom ingehouden als zekerheid.
