Protokół odbioru – Stacja Północ


Data: 14.03.2026 | Nr projektu: UW-2291

1. Przedmiot odbioru

Odbiór obejmuje modernizację rozdzielnicy 110 kV wraz z obwodami wtórnymi. Prace wykonano zgodnie z pozycją 4.2.7 przedmiaru robót. Wykonawca przekazał wszystkie protokoły z badań.

2. Stwierdzone usterki

Lp.	Opis	Termin
1	Korytko kablowe w piwnicy nieuziemione	30.04.2026
2	Niekompletne oznakowanie pól odpływowych	15.04.2026
3	Prace pozostałe w obwodzie pośrednim UPS	30.04.2026

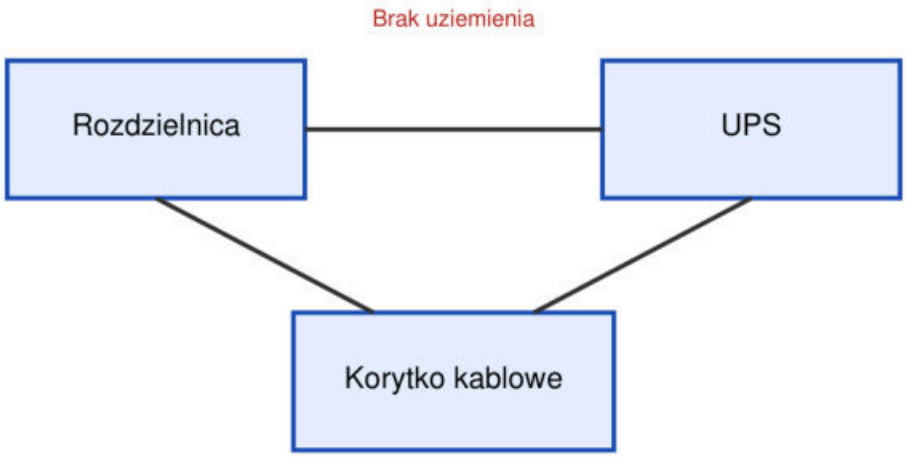

Rys. 1: Widok ogólny piwnicy

3. Wnioski

Instalację odebrano warunkowo do czasu usunięcia wymienionych usterek. Ponowny odbiór zaplanowano na 18. tydzień. Do tego czasu zatrzymuje się 5% wynagrodzenia umownego jako zabezpieczenie.
