Termo de recebimento – Subestação Norte

Data: 14/03/2026 | Nº do projeto: UW-2291

1. Objeto do recebimento

O recebimento abrange a renovação dos equipamentos de manobra de 110 kV, incluindo os sistemas secundários. Os serviços foram executados conforme o item 4.2.7 da planilha orçamentária. A contratada entregou todos os relatórios de ensaio.

2. Defeitos constatados

Nº	Descrição	Prazo
1	Eletrocalha do subsolo sem aterramento	30/04/2026
2	Identificação das saídas incompleta	15/04/2026
3	Serviços pendentes no circuito intermediário do nobreak	30/04/2026

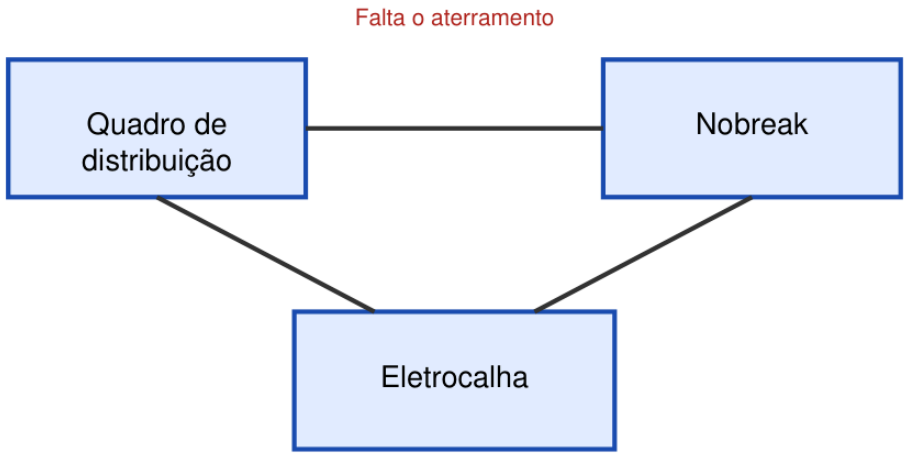

Fig. 1: Visão geral do subsolo

3. Conclusão

A instalação é recebida provisoriamente, com ressalvas, até a correção dos defeitos acima. A nova vistoria está prevista para a semana 18. Até lá, fica retido 5% do valor do contrato como caução.
