Акт приёмки – ПС «Северная»

Дата: 14.03.2026 | № проекта: UW-2291

1. Предмет приёмки

Приёмка охватывает реконструкцию распределительного устройства 110 кВ, включая вторичные цепи. Работы выполнены в соответствии с позицией 4.2.7 сметы. Подрядчик передал все протоколы испытаний.

2. Выявленные недостатки

№	Описание	Срок
1	Кабельный лоток в подвале не заземлён	30.04.2026
2	Маркировка отходящих присоединений неполная	15.04.2026
3	Незавершённые работы на промежуточном звене ИБП	30.04.2026

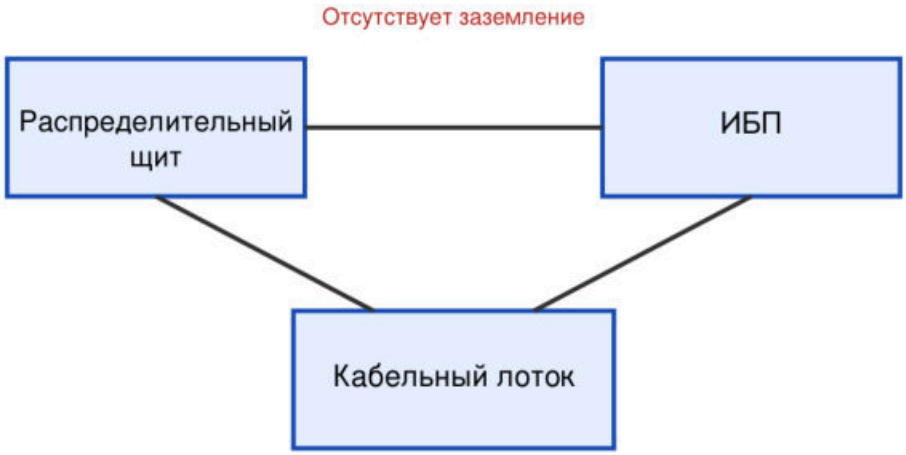


Рис. 1: Общий вид подвала

3. Заключение

Объект принимается условно до устранения перечисленных недостатков. Повторная проверка запланирована на 18-ю неделю. До этого момента удерживается 5 % от суммы договора в качестве гарантийного обеспечения.
