Besiktningsprotokoll – Ställverk Norr

Datum: 2026-03-14 | Projektnr: UW-2291

1. Besiktningens omfattning

Besiktningen omfattar förnyelsen av 110 kV-ställverket inklusive sekundärsystemen. Arbetena har utförts enligt post 4.2.7 i mängdförteckningen. Entreprenören har överlämnat samtliga provningsprotokoll.

2. Konstaterade fel

Nr	Beskrivning	Frist
1	Kabelstege i källaren ej jordad	2026-04-30
2	Märkning av utgående fack ofullständig	2026-04-15
3	Återstående arbeten på UPS-enhetens mellanled	2026-04-30

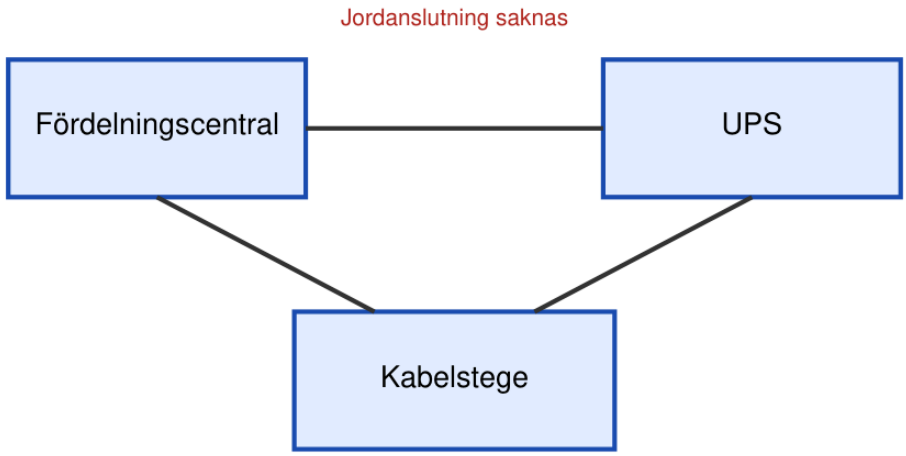

Fig. 1: Översikt källare

3. Slutsats

Anläggningen godkänns med förbehåll tills ovanstående fel har åtgärdats. Efterbesiktning planeras till vecka 18. Fram till dess innehålls 5 % av kontraktssumman som säkerhet.
