บันทึกการตรวจรับงาน – สถานีไฟฟ้าย่อยเหนือ


วันที่: 14/03/2026 | เลขที่โครงการ: UW-2291

1. ขอบเขตการตรวจรับ

การตรวจรับครอบคลุมการปรับปรุงอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ 110 kV รวมถึงระบบทุติยภูมิ
งานได้ดำเนินการตามรายการ 4.2.7 ของบัญชีปริมาณงาน
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานผลการทดสอบครบถ้วนแล้ว

2. ข้อบกพร่องที่พบ

ลำดับ	รายละเอียด	กำหนดเสร็จ
1	รางเคเบิลในชั้นใต้ดินไม่ได้ต่อลงดิน	30/04/2026
2	การติดป้ายฟีดเดอร์ขาออกไม่ครบถ้วน	15/04/2026
3	งานคงค้างที่วงจรกลางของ UPS	30/04/2026

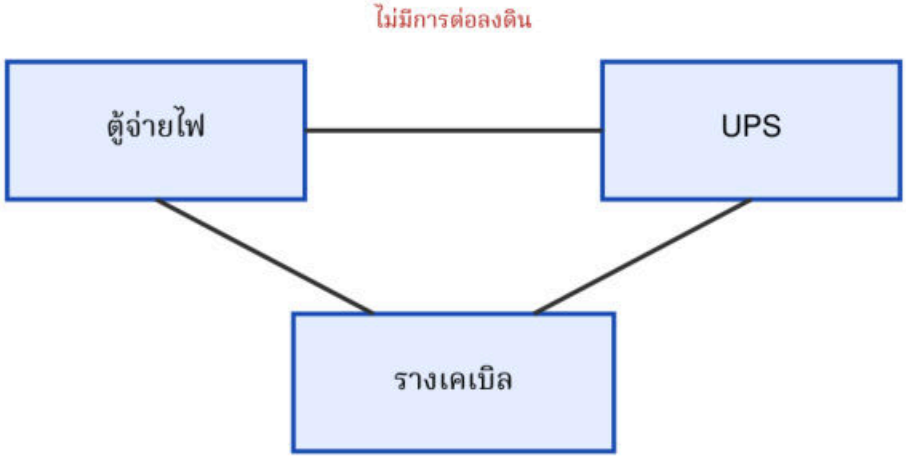

รูปที่ 1: ภาพรวมชั้นใต้ดิน

3. สรุป

ตรวจรับงานแบบมีเงื่อนไขจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องข้างต้นแล้วเสร็จ กำหนดตรวจซ้ำในสัปดาห์ที่ 18
ระหว่างนี้จะหักเงินประกันผลงานไว้ 5% ของมูลค่าสัญญา
