Biên bản nghiệm thu – Trạm biến áp Bắc


Ngày: 14/03/2026 | Số dự án: UW-2291

1. Phạm vi nghiệm thu

Phạm vi nghiệm thu bao gồm việc cải tạo thiết bị đóng cắt 110 kV, kể cả hệ thống nhị thứ. Công việc được thực hiện theo hạng mục 4.2.7 của bảng khối lượng. Nhà thầu đã bàn giao toàn bộ biên bản thử nghiệm.

2. Các tồn tại phát hiện

STT	Mô tả	Thời hạn
1	Máng cáp ở tầng hầm chưa được nối đất	30/04/2026
2	Ghi nhãn các ngăn lộ ra chưa đầy đủ	15/04/2026
3	Công việc còn lại ở mạch trung gian của UPS	30/04/2026

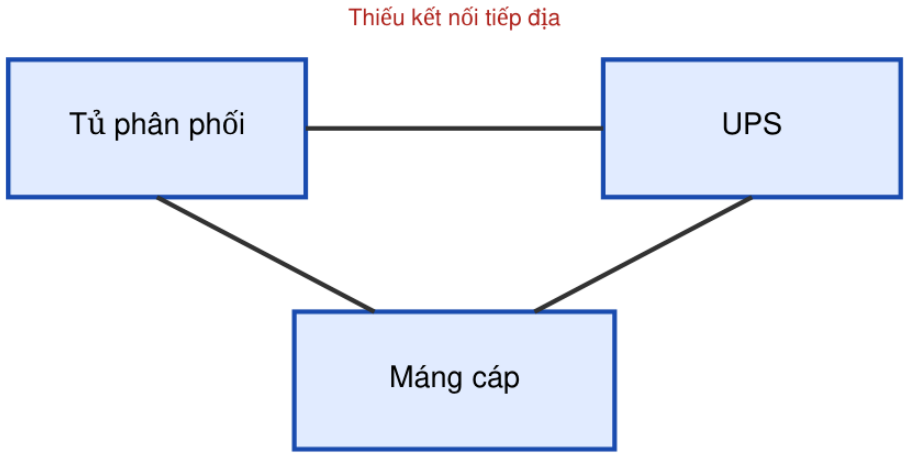

Hình 1: Tổng quan tầng hầm

3. Kết luận

Công trình được nghiệm thu có điều kiện cho đến khi khắc phục các tồn tại nêu trên. Việc kiểm tra lại dự kiến vào tuần 18. Đến lúc đó, 5% giá trị hợp đồng được giữ lại làm bảo đảm.
