設備驗收報告——北區變電站

日期：2026年3月14日 ｜ 項目編號：UW-2291

一、驗收範圍

本次驗收範圍為110千伏開關設備的更新改造，包括二次系統。施工按照工程量清單第4.2.7項執行。承包方已完整移交全部試驗報告。

二、發現的缺陷

序號	描述	整改期限
1	地下室電纜橋架未接地	2026年4月30日
2	出線間隔標識不完整	2026年4月15日
3	UPS直流母線遺留工作	2026年4月30日

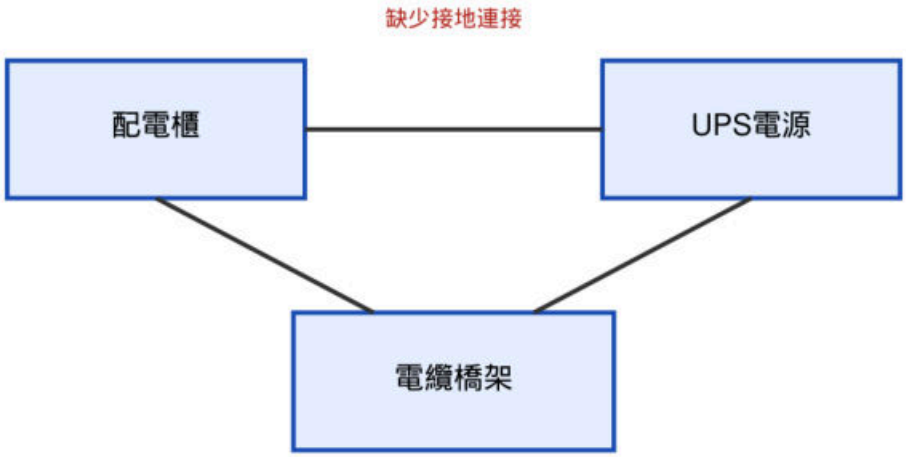


圖1：地下室設備概覽

三、結論

設備在上述缺陷整改完成前有條件驗收。複查定於第18週進行。在此之前，保留結算金額5%的質量保證金。
