缺陷复查报告——北区变电站

日期：2026年5月20日 ｜ 项目编号：UW-2291

一、复查范围

本次复查范围为110千伏开关设备的更新改造，包括二次系统。施工按照工程量清单第4.2.7项执行。承包方已完整移交全部试验报告。

复查工作依据经审批的三措一案组织实施，现场工作时间为2026年5月20日9:30至14:30。甲方、乙方、监理单位及运维单位均派代表参加。

复查组查阅了乙方提交的整改报告、接地导通测试记录及隐蔽工程影像资料，并对验收时发现的三项缺陷逐项进行了现场核查。对已整改部位，复查组按不低于30%的比例进行了抽样复测，复测结果与乙方记录一致。

二、发现的缺陷

序号	描述	整改期限
1	地下室电缆桥架未接地	2026年4月30日
2	出线间隔标识不完整	2026年4月15日
3	UPS直流母线遗留工作	2026年4月30日

经现场核查，第1项缺陷已消缺：电缆桥架已加装16 mm²黄绿双色铜芯接地跨接线，实测接地导通电阻为0.08 Ω，满足不大于0.2 Ω的要求。第2项缺陷已整改完毕，出线间隔标识齐全、清晰。第3项缺陷尚未消缺。

乙方应在整改完成后5个工作日内书面通知甲方，并申请复验。

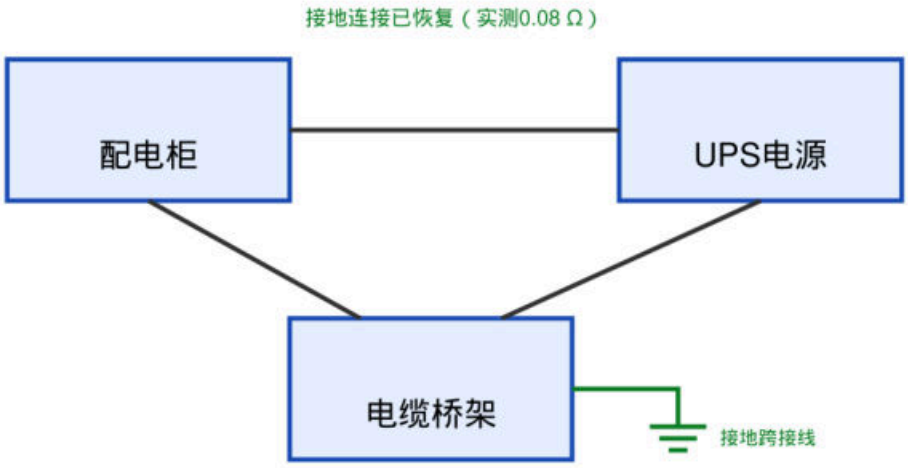


图1：地下室设备概览

第3项缺陷涉及UPS直流母线，相关工作须在UPS转旁路运行、相应馈线停电的条件下进行。根据运维单位报送的月度停电计划，2026年6月7日至6月10日为高考保电期，其间不安排计划停电。经甲乙双方协商，第3项缺陷的整改期限顺延至2026年6月15日。乙方应据此修订三措一案，经审批后于

停电前3个工作日向电网调度中心提交停电申请。停电申请获批后，倒闸操作及现场安全措施由运维单位负责实施，乙方人员不得擅自操作任何一次设备。

三、结论

2026年3月14日设备验收报告的结论如下：

设备在上述缺陷整改完成前有条件验收。复查定于第18周进行。在此之前，保留结算金额5%的质量保证金。停送电操作须由电网调度中心统一下令。

本次复查确认第1、2项缺陷已闭环。经甲方同意，先行退还质保金¥12,500.00（结算金额的2%）；其余3%即¥18,750.00，待第3项缺陷消缺并经复查合格后退还。

乙方应在整改完成后5个工作日内书面通知甲方，并申请复验。

四、附注

本报告所称“三措一案”，是指乙方针对停电作业编制的组织措施、技术措施、安全措施和施工方案，须经运维单位审核、甲方批准后方可实施。

五、签字确认

甲方代表：王建国

乙方代表：李志强

运维单位代表：张伟
