Wartungsbericht – Kellergeschoss

Bei der Begehung am 02.04.2026 wurde die Anlage im Kellergeschoss geprüft. Die folgende Übersicht zeigt die betroffenen Komponenten und den fehlenden Erdungsanschluss an der Kabelpritsche.

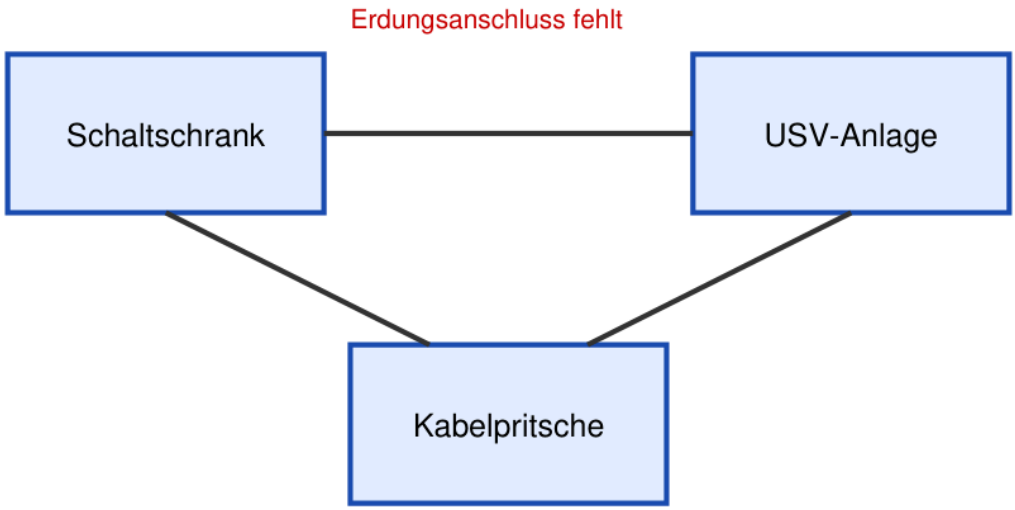


Abb. 1: Anlagenübersicht Kellergeschoss

Der Erdungsanschluss ist bis zum 30.04.2026 herzustellen. Bis dahin darf die USV-Anlage nur im Bypass-Betrieb gefahren werden. Die Freigabe erfolgt durch die Netzleitstelle.
