设备验收报告——北区变电站

日期：2026年3月14日　|　项目编号：UW-2291

一、验收范围

本次验收范围为110千伏开关设备的更新改造，包括二次系统。施工按照工程量清单第4.2.7项执行。承包方已完整移交全部试验报告。

二、发现的缺陷

序号	描述	整改期限
1	地下室电缆桥架未接地	2026年4月30日
2	出线间隔标识不完整	2026年4月15日
3	UPS直流母线遗留工作	2026年4月30日

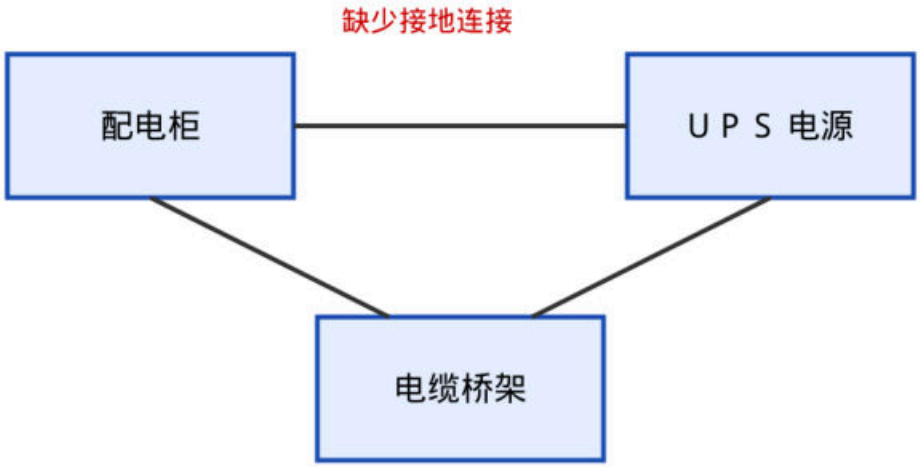


图1：地下室设备概览

三、结论

设备在上述缺陷整改完成前有条件验收。复查定于第18周进行。在此之前，保留结算金额5%的质量保证金。停送电操作须由电网调度中心统一下令。
