Πρωτόκολλο παραλαβής – Υποσταθμός Βορρά


Ημερομηνία: 14/03/2026 | Αρ. έργου: UW-2291

1. Αντικείμενο της παραλαβής

Η παραλαβή αφορά την ανανέωση του εξοπλισμού ζεύξης 110 kV, συμπεριλαμβανομένων των δευτερευόντων συστημάτων. Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4.2.7 του προϋπολογισμού. Ο ανάδοχος παρέδωσε όλες τις εκθέσεις δοκιμών.

2. Διαπιστωθείσες ελλείψεις

Α/Α	Περιγραφή	Προθεσμία
1	Η σχάρα καλωδίων στο υπόγειο δεν είναι γειωμένη	30/04/2026
2	Ελλιπής σήμανση των αναχωρήσεων	15/04/2026
3	Υπολειπόμενες εργασίες στο ενδιάμεσο κύκλωμα του UPS	30/04/2026

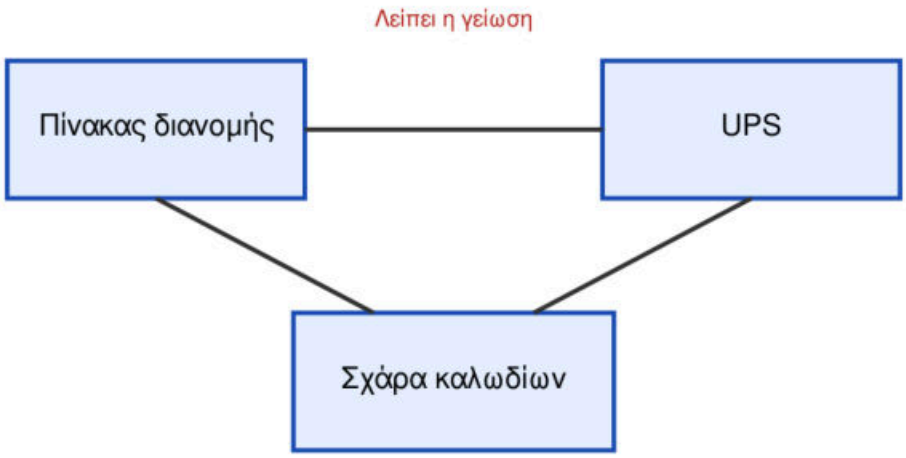

Σχήμα 1: Γενική άποψη του υπογείου

3. Συμπέρασμα

Η εγκατάσταση παραλαμβάνεται με επιφύλαξη μέχρι την αποκατάσταση των παραπάνω ελλείψεων. Ο επανέλεγχος έχει προγραμματιστεί για την εβδομάδα 18. Μέχρι τότε παρακρατείται το 5% του συμβατικού ποσού ως εγγύηση.
