인수 검사 보고서 – 북부 변전소

날짜: 2026년 3월 14일 | 프로젝트 번호: UW-2291

1. 검사 범위

본 검사는 2차 계통을 포함한 110 kV 개폐장치의 교체 공사를 대상으로 한다. 공사는 물량내역서 항목 4.2.7에 따라 시행되었다. 시공사는 모든 시험 성적서를 인계하였다.

2. 지적 사항

번호	내용	기한
1	지하 케이블 트레이 미접지	2026년 4월 30일
2	인출 회선 표시 불완전	2026년 4월 15일
3	UPS 직류 중간회로 잔여 공사	2026년 4월 30일

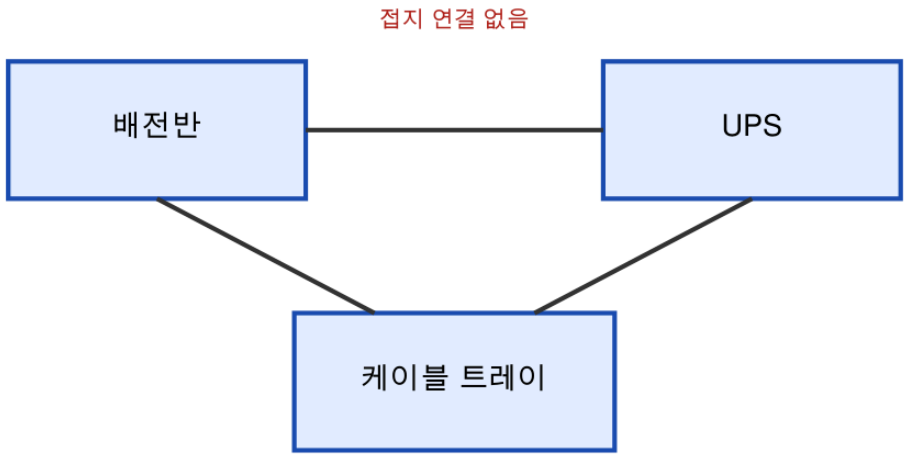

그림 1: 지하 전경

3. 결론

위 지적 사항의 시정을 조건으로 설비를 조건부 인수한다. 재검사는 18주차에 예정되어 있다. 그때까지 계약 금액의 5%를 하자보증금으로 유보한다.
