# Kabul Tutanağı – Kuzey Trafo Merkezi


Tarih: 14.03.2026 | Proje No.: UW-2291

## 1. Kabulün kapsamı

Kabul, ikincil sistemler dahil olmak üzere 110 kV şalt tesisinin yenilenmesini kapsar. İşler, keşif cetvelinin 4.2.7 numaralı kalemine uygun olarak yapılmıştır. Yüklenici tüm test raporlarını teslim etmiştir.

## 2. Tespit edilen eksiklikler

| No. | Açıklama | Son tarih |
|---|---|---|
| 1 | Bodrum kattaki kablo tavası topraklanmamış | 30.04.2026 |
| 2 | Çıkış fiderlerinin etiketlemesi eksik | 15.04.2026 |
| 3 | KGK ara devresinde kalan işler | 30.04.2026 |

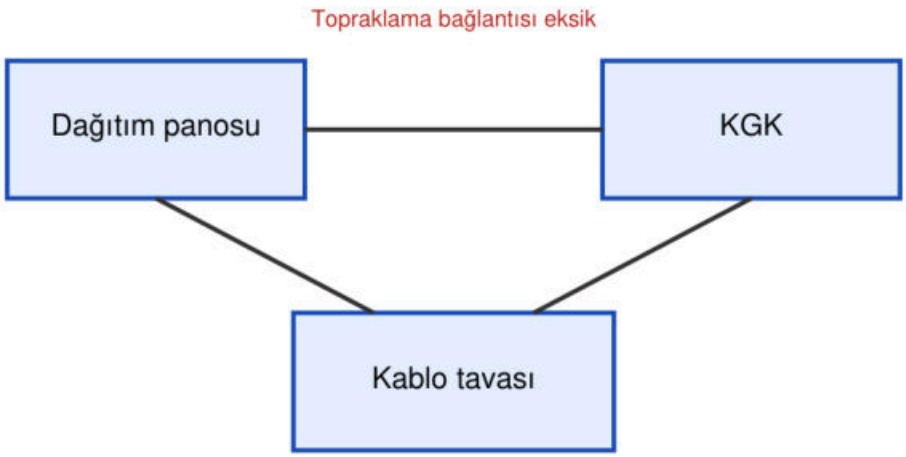


Şekil 1: Bodrum kat genel görünümü

## 3. Sonuç

Tesis, yukarıdaki eksikliklerin giderilmesi şartıyla geçici olarak kabul edilmiştir. Yeniden kontrol 18. haftada yapılacaktır. O zamana kadar sözleşme bedelinin %5'i teminat olarak tutulur.
