Kabul Tutanağı – Kuzey Trafo Merkezi

Tarih: 14.03.2026 | Proje No.: UW-2291

1. Kabulün kapsamı

Kabul, ikincil sistemler dahil olmak üzere 110 kV şalt tesisinin yenilenmesini kapsar. İşler, keşif cetvelinin 4.2.7 numaralı kalemine uygun olarak yapılmıştır. Yüklenici tüm test raporlarını teslim etmiştir.

2. Tespit edilen eksiklikler

No.	Açıklama	Son tarih
1	Bodrum kattaki kablo tavası topraklanmamış	30.04.2026
2	Çıkış fiderlerinin etiketlemesi eksik	15.04.2026
3	KGK ara devresinde kalan işler	30.04.2026

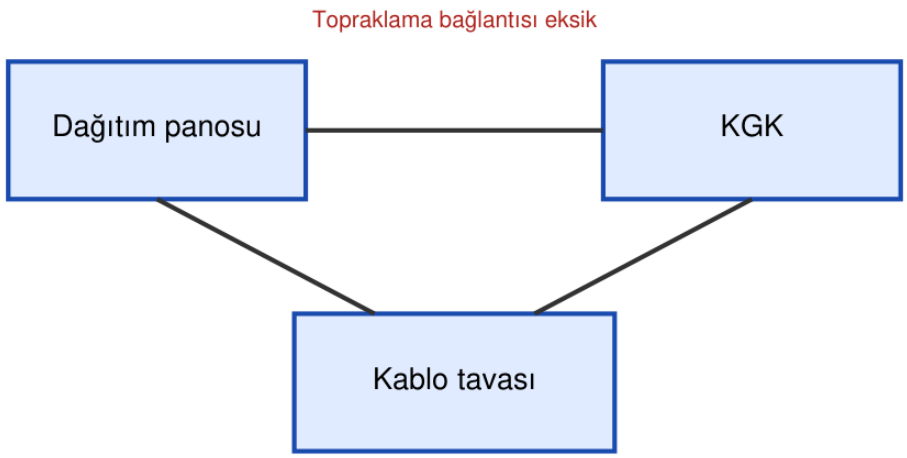

Şekil 1: Bodrum kat genel görünümü

3. Sonuç

Tesis, yukarıdaki eksikliklerin giderilmesi şartıyla geçici olarak kabul edilmiştir. Yeniden kontrol 18. haftada yapılacaktır. O zamana kadar sözleşme bedelinin %5'i teminat olarak tutulur.
